

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 39081

č. Zhotovitele: 2015/149/S-167

„Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Zdeněk Beneš	602 495 153	zdenek.benes@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Martin Lisoněk	739 240 721	martin.lisonek@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **HOMOLA a.s.**
se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, B2654
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
č.účtu: 598144761/0100
IČ: 26792770
DIČ: CZ26792770
zastoupen: Ing. Vítem Dostálem, místopředsedou představenstva a ředitelem
Ing. Michalem Homolou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Vít Dostál Ing. Milan Kápka	596 940 040 737 255 882	sekretariat@homola.as mkapka@homola.as
technických	Ing. Jan Beněk	724 034 879	jbenek@homola.as
zapisovat do deníku	Lumír Nykš Ing. Michal Homola	777 148 711 777 148 717	lnyks@homola.as mihomola@homola.as
předání a převzetí díla	Lumír Nykš Ing. Michal Homola	777 148 711 777 148 717	lnyks@homola.as mihomola@homola.as
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Petr Plesník	607 966 463	Plesnik.petr@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.

2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice**“ spočívající v provedení rekonstrukce stávajících zkorodovaných potrubních nadzemních rozvodů stabilních chladicích zařízení (SCHZ) nadzemních nádržových bloků na skladu ČEPRO, a.s. Sedlnice. Potrubní rozvody je Zhotovitel povinen v rozsahu požadovaném Objednatelům vyměnit v souladu s technickým řešením dle této Smlouvy a Závazných podkladů tak, aby potrubí SHZ a SCHZ bylo provozuschopné a funkční a sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Nové potrubní rozvody budou v provedení trubka ocelová, bezešvá dle ČSN 42 5715 – pozinkovaná. Realizace díla Zhotovitelem zahrnuje zejména níže uvedené činnosti (dodávky, služby a jiné výkony):

Demontovány budou Zhotovitelem potrubní rozvody SCHZ DN 50 a DN 100 a nahrazeny novými potrubními rozvody z pozinkovaných trubek ve stejných dimenzích dle specifikace ve výkazu výměr (viz Příloha č. 1) a schématu potrubních nadzemních rozvodů SCHZ nadzemních nádržových bloků na skladu ČEPRO, a.s. Sedlnice (viz Příloha č. 3). Zhotovitel je povinen rovněž provést výměnu vodorovných rozvodů potrubí SCHZ spojující paty nádrží obj. H203 1 – 10, obj. 190, 222, 223 a 360 a obj. budovy 524 SHZ (stabilní hasicí zařízení) dle výkazu výměr (Příloha č. 1).

Potrubí budou umístěna na stávajících potrubních mostech a podpěrách na nádržích. U vstupu do objektů bude provedena obnova stávajících protipožárních ucpávek.

U všech nových potrubních rozvodů Zhotovitel provede barevné značení potrubí (červenými pruhy po úsecích). Realizace díla výše uvedeného zahrnuje dále též dodávky, služby a jiné výkony spočívající zejména v ekologické likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla Zhotovitelem, ve vypracování dokumentace skutečného provedení (ve 3 vyhotoveních + 1x ve formátu „pdf“ a ve zdrojových formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ na CD nebo DVD) a provedení požadovaných zkoušek pro prokázání parametrů díla – zejména tlakové zkoušky, komplexní vyzkoušení, apod., předání dokumentace nutné k užívání díla, uvedení díla do provozu a jeho předání Objednateli.

(dále též jen „**Dílo**“)

2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 3. 7. 2015 k zakázce č.: 141/15/OCN nazvané „**Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice**“, včetně jejich příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),

- b) nabídky Zhotovitele ze dne 23. 7. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky, a který je schválen ze strany Objednatele.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat veškerou dokumentaci nutnou pro provedení Díla Zhotovitelem. Zhotovitel vypracuje veškerou technickou dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací a v termínu podle Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele, a zavazuje se zajistit a předat Objednateli veškeré doklady plynoucí z této Smlouvy a jejich nedílných součástí. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést veškeré zkoušky Díla/na Díle požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami.
- 2.8. Objednatel zajistí pro realizaci Díla zejména povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Stavenišťě), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen „**Harmonogram plnění**“), požární asistenci po dobu prací Zhotovitele a provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH).
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje provést k prokázání parametrů Díla a v rámci vyzkoušení Díla veškeré zkoušky požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami dle a na základě této Smlouvy.
- 2.10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
- 2.11. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání Stavenišťě Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

ČI. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: **sklad Objednatele Sedlnice: 742 56, Sedlnice, č.p. 503 – vyhrazené Stavenišťě předané Objednatel Zhotoviteli.**
- 3.1.1. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla.
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z provozních důvodů Objednatele, nebo z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
- Termín zahájení Díla: v den stanovený ve výzvě Objednatele k převzetí Stavenišťě Zhotovitelem, přičemž předpokládaný termín zahájení a realizace Díla je plánován na srpen 2015.
 - Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena do 30. 11. 2015, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem prováděno postupně na více etap (výměna potrubních rozvodů bude prováděna postupně vždy u jedné nádrže) tak, aby byla zachována funkčnost systému chlazení ostatních nádrží dle Technologického postupu prací zpracovaného

Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleného, který tvoří součást Nabídky a samostatně je připojen k této Smlouvě též jako Příloha č. 4 této Smlouvy.

- 3.5. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo po etapách v termínech uvedených v Harmonogramu plnění zpracovaným Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleným. Harmonogram plnění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný. V případě změny dílčích termínů a dílčích lhůt, jež nebudou mít dopad na lhůtu stanovenou pro dokončení a předání Díla, Smluvní strany sjednávají, že taková změna může být provedena na základě požadavku Objednatele s ohledem na jeho obchodní a provozní priority či dle dohody Smluvních stran, přičemž tato změna nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku dle závěrečných ujednání této Smlouvy, avšak v případě změny některého dílčího termínu či dílčí lhůty se Smluvní strany zavazují a souhlasí, že tato změna nabude platnosti zápisem učiněným ve Stavebním deníku Zástupci Smluvních stran a zároveň bude vyhotoven upravený Harmonogram plnění, jež bude rovněž stvrzen podpisy oprávněných Zástupců obou Smluvních stran.
- 3.6. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu skladu Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.
- 3.7. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat v zóně s nebezpečím výbuchu, a této skutečnosti je Zhotovitel povinen přizpůsobit provádění Díla, jakož i technické vybavení a osobní ochranné pomůcky osob podílejících se na realizaci Díla v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen.
- 3.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na straně Zhotovitele či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele a na Stavenišťě a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel zodpovědnost.
- 3.9. Přejímka Stavenišťě
 - 3.9.1. Přejímka Stavenišťě proběhne jednorázově.
 - 3.9.2. Nebude-li datum přejímky Stavenišťě uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený v písemné výzvě Objednatele ve smyslu VOP.
 - 3.9.3. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla po uzavření této Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnění.
 - 3.9.4. Součástí předání a převzetí Stavenišťě, je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavenišťě.
 - 3.9.5. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Stavenišťě bez vad ve lhůtě předání Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:
1 350 500,- Kč (slovy: jedenmiliontřístapadesáttisícpětset korun českých)
(dále a výše jen „Cena díla“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cenová nabídka s výkazem výměr je Přílohou č.1 této Smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelům uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 5.3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelům) a číslo int. objednávky **4500047183**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla, tj. všech etap v rámci Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
- 6.2.1. dokumentace skutečného provedení Díla (technologický postup včetně popisu použitých materiálů);
 - 6.2.2. fotodokumentace o průběhu realizace Díla;
 - 6.2.3. technickou specifikaci, technologické listy, atesty, prohlášení o shodě jednotlivých dodávaných zařízení, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla, dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
 - 6.2.4. protokoly o provedených zkouškách (v rámci vyzkoušení Díla);
 - 6.2.5. doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vydaný výrobcem zařízení nebo jím pověřenou osobou v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
 - 6.2.6. stavební deník;
 - 6.2.7. doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla,
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 2 x v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech: „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“.

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zjištěné vady, nejedná-li se o vadu druhu Havárie či vadu znemožňující řádné užívání Díla Objednatelům, odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů a při odstraňování vad postupovat s ohledem na charakter vady a rovněž v souladu s touto Smlouvou, zejména je povinen dodržet všechny požadavky Objednatelům dotýkající se provozu skladu pohonných hmot a dotčených zařízení jako při realizaci Díla v rámci jednotlivých etap.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky nebo na e-mailové adrese: sekretariat@homola.as, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění:
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč;
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelům vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatel.
- 9.8. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 9.9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 9.10. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- 9.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.13. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo

technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.

10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 24. 8. 2015 - výkaz výměr
- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění schválený ze strany Objednatele
- Příloha č. 3 – Schéma sklad Sedlnice
- Příloha č. 4 – Technologický postup prací schválený ze strany Objednatele

10.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.11.1. Na tento smluvní vztah se neuzije následující článek VOP: čl. 6.3. Hrazení Ceny díla průběžně a čl. 6.7. Zadržné.

10.12. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>

V Praze dne: 21-09-2015

V Ostravě dne:

29. 09. 2015

Za Objednatele

Za Zhotovitele

ČEPRO, a.s.

HOMOLA a.s.



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 6 p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl Is, vložka 2341

043



HOMOLA a.s., Vrařimovská 624/11
718 00 Ostrava-Kunčičky, Czech Republic
IČ: 26792770, DIČ: CZ26792770
www.homola.cz

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Vít Dostál
místopředseda představenstva a
ředitel

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Ing. Michal Homola
člen představenstva

Výměna páteřních potrubních rozvodů SCHZ DN 100, DN 50

Sklad: ČEPRO, a.s., sklad Sedlnice

p.č.	Název Hlavní rozměry	Označení	Typ - Rozměr Norma	Materiál	DN	PN	Množství v potrubních větvích							Celkem za PS	Cena dodatky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka																							
							1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
1	Trubka bezševá DN 100	e 114,3x4	ČSN 42 571,5 - zinek	12 021.1	100	40	684									563,00	385 092,00	270,00	184 680,00	569 772,00																							
2	Trubka bezševá DN 50	ø 60,3x3,2	ČSN 42 571,5 - zinek	12 021.1	50	40	102									224,00	22 848,00	112,00	11 424,00	34 272,00																							
3	Příruba plochá DN 100	typ 01, PN 16	ČSN EN 1092-1	S235	100	16	10									2 000,00	20 000,00	540,00	5 400,00	23 400,00																							
4	Průl. spoj přemosťný, pozinkovaný	PN 16	ČSN 13 1092		100	16	10									1 790,00	17 900,00			17 900,00																							
5	Pěšerní ploché DN 100			expand-grafit	100	16	10									58,80	588,00			588,00																							
6	Dražkové spojky 60,3 zinek				50	30	30									189,60	5 688,00			5 688,00																							
7	Dražkové spojky 009 114,3 zinek				100	150	150									442,00	66 300,00			66 300,00																							
8	Koleno No. 001 114,3 zinek				100	105	105									561,40	58 947,00	120,60	12 863,00	71 610,00																							
9	Koleno No. 001 60,3 zinek				50	20	20									294,00	5 880,00	65,00	1 300,00	7 180,00																							
10	Navrtávací pus S 920 114x1 zinek				100	1	1									806,00	806,00	1 054,00	1 054,00	1 860,00																							
11	Navrtávací pus S 920 114x60, zinek, držák				100	11	11									833,00	9 163,00	1 057,00	11 627,00	20 790,00																							
12	Prosjena držákového stroje					1	1											1 000,00	1 000,00	1 000,00																							
Demontáž stávajícího požárního potrubí, odřezání stávajícího uchycení potrubí, natřování trubky pro spojení spojkami Victaulic, zhotovení nového uchycení potrubí, třmeny - 130 ks ,úprava stávajícího rozdělovače - pozinkování, kompletace technologie, montážní a svařecké práce - zámečnické práce																																			140 700,00	140 700,00	147 900,00	147 900,00	288 600,00				
13	Nátěr opravené části podpěr					1	1												15 000,00	15 000,00	15 000,00																						
14	Veškeré náklady na dopravu, manipulaci, zřízení pracoviště, ubytování, dokumentaci, vedení, atd.					1	1												55 000,00	55 000,00	55 000,00																						
15	Projektování a inženýrská činnost					1	1												21 000,00	21 000,00	21 000,00																						
16	Dodavatelská a dílenská dokumentace včetně zaměřovacích prací					1	1												38 000,00	38 000,00	38 000,00																						
17	Dokumentace skutečného provedení					1	1												16 300,00	16 300,00	16 300,00																						
18	Předávací dokumentace systému					1	1												11 000,00	11 000,00	11 000,00																						
19	Vypouštění a napouštění systému					1	1												8 500,00	8 500,00	8 500,00																						
20	Proplach systému po dokončení montáže					1	1												13 000,00	13 000,00	13 000,00																						
21	Tlakové zkoušky potrubního systému					1	1												21 000,00	21 000,00	21 000,00																						
22	Uvedení do provozu a komplexní odzkoušení					1	1												13 000,00	13 000,00	13 000,00																						
23	Obnova propojzárních ucpávek potrubí					10	10												2 774,00	2 774,00	27 740,00																						
Celkem rozpočtové náklady																																					1 350 500						




ČEPRO, a.s.

Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sednice

HOMOLA

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

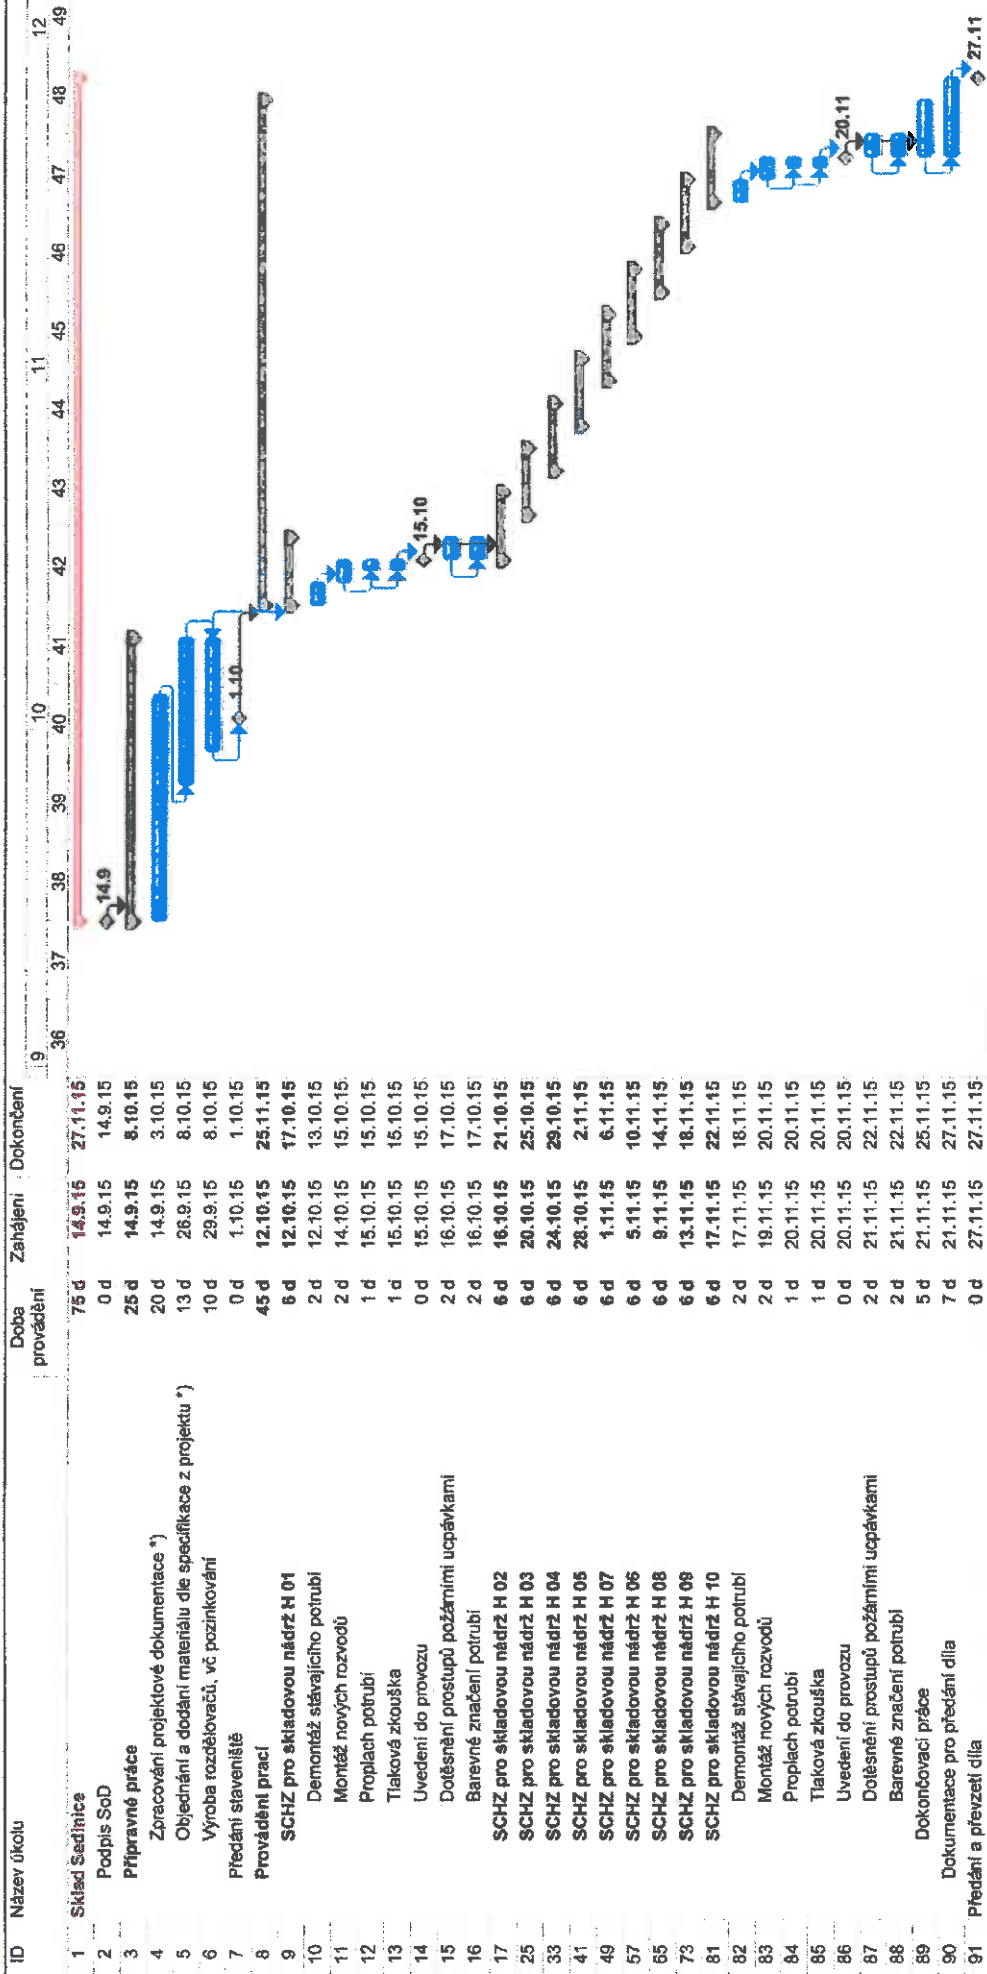

Projekt: Sklad Sednice.mpp
Datum: 22.7.15

Úkol


Rozdělení

Milník

Souhm

Deadline

ŠACHTA "D" HAŠENÍ "D"

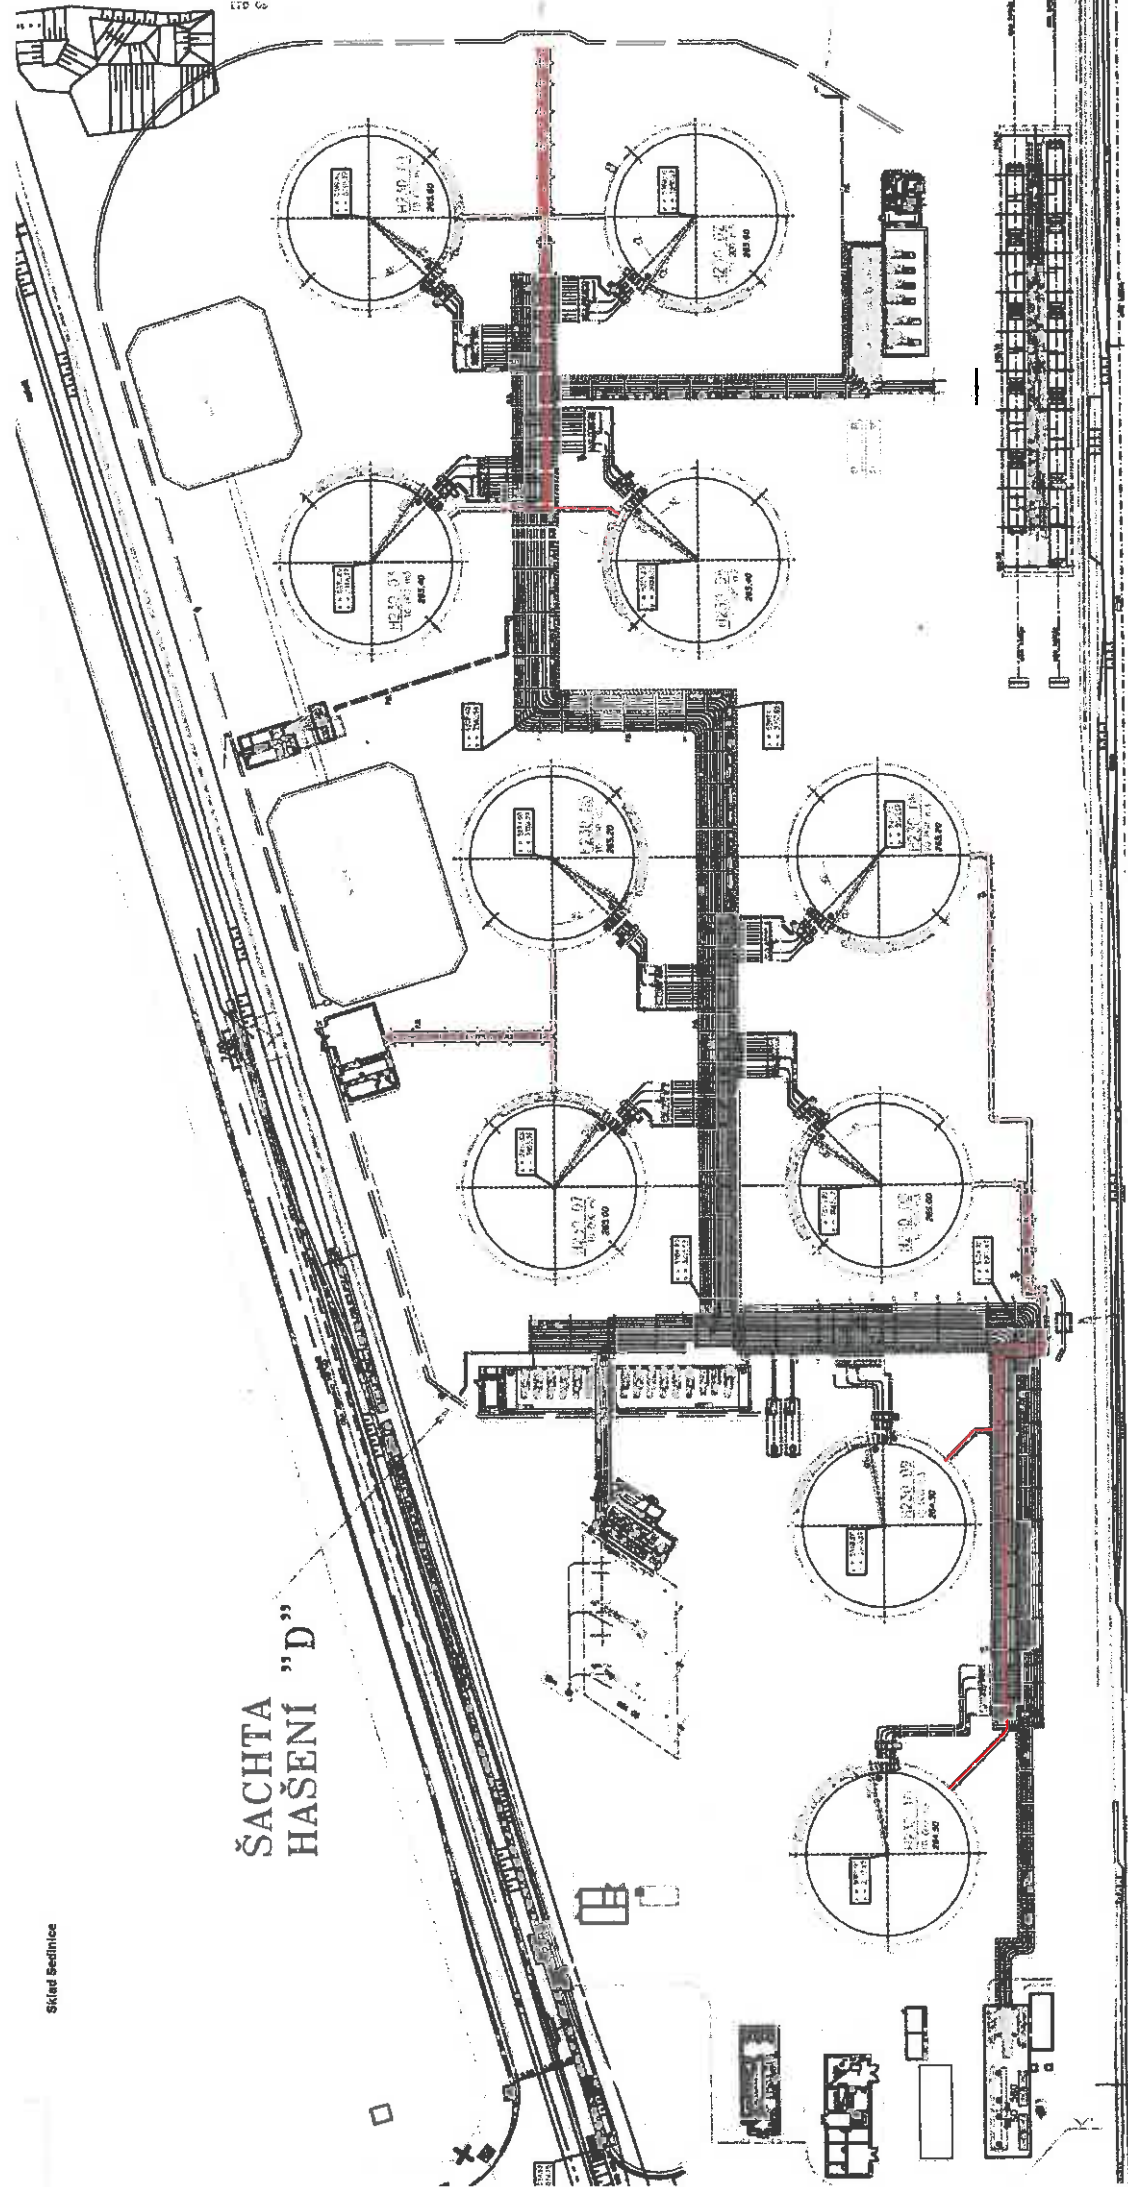

Skled Bedřnice

ETD 02

HOMOLA

HOMOLA a.s.
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel: 596 940 040, e-mail: sekretariat@homola.as
IČ: 26792770, DIČ: CZ26792770

Místo a datum vydání: Ostrava, 21.7.2015
Číslo výtisku/ počet předaných výtisků: /
Revize č..., s účinností od:

TPP 149/15

Technologický postup prací

Zakázky:

Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice



Objednatel: ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

1. Termíny provádění

Jsou patrný z časového harmonogramu výstavby

2. Návaznost a souběh pracovních operací

Přípravné práce

- Projektové práce – kladečské schéma potrubí
- Nákup materiálu, doprava na místo montáže, uskladnění (sklad Sedlnice).
- Výroba rozdělovačů – zámečnický výrobek, pozinkování.
- Zajištění BOZP na staveništi

Pro každou nádrž samostatně bude prováděn následující postup prací

- Demontáž stávajícího potrubí
 - Odpojení potrubí
 - Uvolnění třmenů
 - Demontáž stávajících rozdělovačů
 - Bezjiskrové dělení potrubí na manipulovatelné části pomocí hydraulických nůžek
 - Odvoz do bezpečného prostoru, rozřezání, uložení dle pokynů objednatele
 - Oprava nátěru podpěrné konstrukce
- Montáž nových rozvodů chladicí vody
 - Pomocné lešení, zvýšení pracovní plochy
 - Ukládání potrubí na konstrukci a spojování drážkovými spojkami
 - V případě krácení potrubí na potřebnou délku dle kladečského schématu nalisování drážky na zkrácený konec, ošetření řezu zinkovým nástřikem
 - Upevnění potrubí na podpěrnou konstrukci pomocí třmenů
 - Montáž rozdělovačů
 - Dopojení potrubí do systému
 - Demontáž lešení
- Proplach potrubí
- Tlaková zkouška
- Uvedení do provoz, komplexní vyzkoušení
- Dotěsnění prostupů požárními ucpávkami
- Nátěr potrubí, barevné značení potrubí (červenými pruhy po úsecích)
- Zaměření geodetem

Dokončovací práce

- Projektové práce – dokumentace skutečného provedení
- Dokumentace pro předání díla
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu
- Likvidace odpadů

Pracovní síly

Složení pracovní čety pro stavbu potrubí:

- | | |
|---|------------------|
| - Předák | 1 pracovník (SŠ) |
| - Strojník (jeřábník) | 1 pracovník |
| - Řidič | 1 pracovník |
| - Kvalifikovaný dělník (montér, lešenář, ...) | 2 pracovníci |
| - Stavební dělník | 1 pracovník |

počet čet 1

3. Odborný a jiný dozor nad prováděnými pracemi

Odborný a jiný dozor nad prováděnými pracemi bude zajišťován vedením stavby – stavbyvedoucím.

4. Strojní vybavení, dopravní, hutnící a zdvihací prostředky a speciální pomůcky

Nákladní vozidlo MAN, autojeřáb AD 28, montážní dílna MAN, hydraulické nůžky pro demontáž bezjiskrovou metodou, drážkovací stroj, ruční nářadí

5. Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí

Lešení.

6. Materiály

Bezešvé trubky hladké dle rozměrové normy ČSN 42 5715, jakost oceli 12 021.1 (podle ČSN 420251), pozinkované s drážkou. Tvarovky a drážkové spojky Victaulic S 009.

7. Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí

Základními bezpečnostními předpisy jsou Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zejména Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb.

Před zahájením prací seznámí Zadavatel písemně vedoucího pracovníka stavby se zásadami bezpečného chování na pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Stavbyvedoucí písemně seznámí určené pracovníky Zadavatele s riziky stavební činnosti. Vedoucí pracovníci písemně seznámí s tímto všechny pracovníky vstupující na staveniště.

8. Vyhodnocení významných rizik souvisejícími s pracemi dle tohoto TPP

Rizika z vlastních činností na stavbě vyhodnocuje stavbyvedoucí a seznamuje s nimi vlastní zaměstnance a zaměstnance subdodavatelů. Taktéž seznamuje vlastní zaměstnance s riziky činností případných subdodavatelů. Oboustranné seznámení s riziky je prokazatelně zaznamenáno do knihy BOZP. Vyhodnocení rizik jednotlivých prací (včetně prací subdodavatelů) s návrhem konkrétních technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik je navrženo v dokumentu IVR 149/15.

9. Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje

Staveniště je v uzavřeném, střeženém areálu, nepředpokládáme zvláštní opatření.

10. Technická opatření

Technická opatření budou denně kontrolována a zajišťována proškolenými pracovníky zhotovitele. Za provedení těchto opatření zabezpečující omezení rizik zodpovídá příslušný stavbyvedoucí zhotovitele. Zejména se jedná o zajištění výkopů jam, označením nebezpečných zón stavby a zajištění individuálních bezpečnostních opatření.

11. Opatření při pracích za mimořádných podmínek

Zhotovitel bude provádět pravidelný monitoring předpovědí počasí (klimatických podmínek). Na základě předpovědí počasí určí stavbyvedoucí formou zápisu ve stavebním deníku opatření s ohledem na zřetel dodržení BOZP a PO při prováděné práci.

V Ostravě 21.7.2015
