

## SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 39135

### „Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Třemošná“

#### Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.účtu: 11902931/0100  
IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a  
Ing. Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Ivo Jírovský	739 240 352	<a href="mailto:ivo.jirovsky@ceproas.cz">ivo.jirovsky@ceproas.cz</a>
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Ing. Václav Polanka	724 006 221	<a href="mailto:vaclav.polanka@ceproas.cz">vaclav.polanka@ceproas.cz</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240 717	<a href="mailto:vaclav.koukolik@ceproas.cz">vaclav.koukolik@ceproas.cz</a>

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **TRASER CZ, s.r.o.**  
se sídlem: Vídeňská 102, 619 00 Brno  
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C64932  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 5004061997/5500  
IČ: 29198186  
DIČ: CZ29198186  
zastoupen: Ing. Lubošem Dostálem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Dominika Holcová	723 320 266	<a href="mailto:holcova@traser.eu">holcova@traser.eu</a>
technických	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	<a href="mailto:svadlenka@traser.eu">svadlenka@traser.eu</a>
zapisovat do deníku	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	<a href="mailto:svadlenka@traser.eu">svadlenka@traser.eu</a>
předání a převzetí díla	Ing. Michal Švadlenka	602 699 797	<a href="mailto:svadlenka@traser.eu">svadlenka@traser.eu</a>
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Martin Macák	725 555 014	<a href="mailto:macak@traser.eu">macak@traser.eu</a>

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Třemošná**“ spočívající v provedení rekonstrukce stávajících zkorodovaných potrubních nadzemních rozvodů stabilních chladicích zařízení (SCHZ) nadzemních nádržových bloků na skladu ČEPRO, a.s. Třemošná. Potrubní rozvody je Zhotovitel povinen v rozsahu požadovaném Objednatelům vyměnit v souladu s technickým řešením dle této Smlouvy a Závazných podkladů tak, aby potrubí SCHZ bylo provozuschopné a funkční a sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Nové potrubní rozvody budou v provedení trubka ocelová, bezešvá dle ČSN 42 5715 – pozinkovaná. Realizace díla Zhotovitelem zahrnuje zejména níže uvedené činnosti (dodávky, služby a jiné výkony):

Demontovány budou Zhotovitelem potrubní rozvody SCHZ DN 50, DN 65, DN 100 a nahrazeny novými potrubními rozvody z pozinkovaných trubek ve stejných dimenzích dle specifikace ve výkazu výměr (viz Příloha č. 1) a schématu potrubních nadzemních rozvodů SCHZ nadzemních nádržových bloků na skladu ČEPRO, a.s. Třemošná (viz Příloha č. 3).

U všech 6 předmětných nádrží budou Zhotovitelem doplněny odvodňovací a proplachovací armatury DN 50, u nádrží H211A a H211B budou rovněž instalovány nové kohouty, filtry a trysky (dle Přílohy č. 1 této Smlouvy).

U všech nových potrubních rozvodů bude provedeno barevné značení potrubí (červenými pruhy po úsecích). Realizace díla výše uvedeného zahrnuje dále též dodávky, služby a jiné výkony spočívající zejména v ekologické likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla Zhotovitelem, ve vypracování dokumentace skutečného provedení (ve 3 vyhotoveních + 1x ve formátu „pdf“ a ve zdrojových formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ na CD nebo DVD) a provedení požadovaných zkoušek pro prokázání parametrů díla – zejména tlakové zkoušky, komplexní vyzkoušení, doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení) předání dokumentace nutné k užívání díla, uvedení díla do provozu a jeho předání Objednateli.

(dále též jen „Dílo“)

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
- Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 3. 7. 2015 k zakázce č.: 141/15/OCN nazvané „**Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
  - nabídky Zhotovitele č. 15 181 ze dne 24. 7. 2015 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“).

- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky, a který je schválen ze strany Objednatele.
- 2.7. Objednatel zajistí pro realizaci Díla zejména povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Stavenišťě), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen „**Harmonogram plnění**“), požární asistenci po dobu prací Zhotovitele a provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH).
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat veškerou dokumentaci nutnou pro provedení Díla Zhotovitelem. Zhotovitel vypracuje veškerou technickou dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací a v termínu podle Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele, a zavazuje se zajistit a předat Objednateli veškeré doklady plynoucí z této Smlouvy a jejích nedílných součástí. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést veškeré zkoušky Díla/na Díle požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami.
- 2.9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy.
- 2.10. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání Stavenišťě Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

### Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je: **sklad Objednatele Třemošná: 330 11, Třemošná, č.p. 1057 – vyhrazené Stavenišťě předané Objednatel Zhotoviteli.**
  - 3.1.1. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla.
- 3.2. Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z provozních důvodů Objednatele, nebo z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Termíny provedení Díla:
  - Termín zahájení Díla: v den stanovený ve výzvě Objednatele k převzetí Stavenišťě Zhotovitelem, přičemž předpokládaný termín zahájení a realizace Díla je plánován na srpen 2015.
  - Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena do 18. 12. 2015, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem prováděno postupně na více etap (výměna potrubních rozvodů bude prováděna postupně vždy u jedné nádrže) tak, aby byla zachována funkčnost systému chlazení ostatních nádrží dle Technologického postupu prací zpracovaného Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleného, který tvoří součást Nabídky a samostatně je připojen k této Smlouvě též jako Příloha č. 4 této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo po etapách v termínech uvedených v Harmonogramu plnění zpracovaným Zhotovitelem a ze strany Objednatele schváleným. Harmonogram plnění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je pro Zhotovitele závazný. V případě změny dílčích termínů a dílčích lhůt, jež nebudou mít dopad na lhůtu stanovenou pro dokončení a předání Díla, Smluvní strany

sjednávají, že taková změna může být provedena na základě požadavku Objednatele s ohledem na jeho obchodní a provozní priority či dle dohody Smluvních stran, přičemž tato změna nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku dle závěrečných ujednání této Smlouvy, avšak v případě změny některého dílčího termínu či dílčí lhůty se Smluvní strany zavazují a souhlasí, že tato změna nabude platnosti zápisem učiněným ve Stavebním deníku Zástupci Smluvních stran a zároveň bude vyhotoven upravený Harmonogram plnění, jež bude rovněž stvrzen podpisy oprávněných Zástupců obou Smluvních stran.

- 3.6. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu skladu Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění.
- 3.7. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat v zóně s nebezpečím výbuchu, a této skutečnosti je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění Díla, jakož i technické vybavení a osobní ochranné pomůcky osob podílejících se na realizaci Díla v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen.
- 3.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na straně Zhotovitele či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele a na Stavenišťě a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese Zhotovitel zodpovědnost.
- 3.9. Přejímka Stavenišťě
  - 3.9.1. Přejímka Stavenišťě proběhne jednorázově.
  - 3.9.2. Nebude-li datum přejímky Stavenišťě uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený v písemné výzvě Objednatele ve smyslu VOP.
  - 3.9.3. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla po uzavření této Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnění.
  - 3.9.4. Součástí předání a převzetí Stavenišťě, je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
    - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavenišťě.
  - 3.9.5. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Stavenišťě bez vad ve lhůtě předání Díla.

## Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:  
**2 990 000,- Kč (slovy: *dvamilionydevětsetdevadesátitřicet korun českých*)**  
(dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Cenová nabídka s výkazem výměr je Přílohou č.1 této Smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Adresy pro doručení faktur:
  - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

- 5.3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelům) a číslo int. objednávky **4500047321**.

## Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla, tj. všech etap. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 6.2. Pro účely převzetí a před převzetím je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
- 6.2.1. dokumentace skutečného provedení Díla (technologický postup včetně popisu použitých materiálů);
  - 6.2.2. fotodokumentace o průběhu realizace Díla;
  - 6.2.3. technickou specifikaci, technologické listy, atesty, prohlášení o shodě jednotlivých dodávaných zařízení, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla, dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
  - 6.2.4. doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vydaný výrobcem zařízení nebo jím pověřenou osobou v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
  - 6.2.5. protokoly o provedených zkouškách (v rámci vyzkoušení Díla);
  - 6.2.6. stavební deník;
  - 6.2.7. doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla,
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
  - 2 x v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech: „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“.

## Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zjištěné vady, nejedná-li se o vadu druhu Havárie či vadu znemožňující řádné užívání Díla Objednatelům, odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů a při odstraňování vad postupovat s ohledem na charakter vady a rovněž v souladu s touto Smlouvou, zejména je povinen dodržet všechny požadavky Objednatelů dotýkající se provozu skladu pohonných hmot a dotčených zařízení jako při realizaci Díla v rámci jednotlivých etap.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Vídeňská 102, 619 00 Brno nebo na e-mailové adrese: [havlova@traser.eu](mailto:havlova@traser.eu) na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin.

## Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění:
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč;

- pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezakládá-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

## Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 9.9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinně Smluvní straně písemnou formou.
- 9.10. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.



- 9.13. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

## Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex.pdf> (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejich příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vstoupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
- 10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 24. 8. 2015 - výkaz výměr

- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění schválený ze strany Objednatele
- Příloha č. 3 – Schéma sklad Třemošná
- Příloha č. 4 – Technologický postup prací schválený ze strany Objednatele

10.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

10.11.1. Na tento smluvní vztah se neužije následující článek VOP: čl. 6.3. Hrazení Ceny díla průběžně a čl. 6.7. Zadržné.

10.12. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>

V Praze dne: 29-09-2015

V Brně dne: 12.10.2015

Za Objednatele  
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele  
TRASER CZ s.r.o.



043

**TRASER CZ s.r.o.**  
Václavská 134/102, 619 00 Brno  
IČ: 29198186, DIČ: CZ29198186  
Tel.: +420 728 247 794

.....  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

.....  
Ing. Luboš Dostál  
jednatel

.....  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva



**Výměna potrubních rozvodů SCHZ - sklad Třemošná****1. Výměna vodorovného potrubí od příruby v budově SHZ 411 k patě jednotlivých nádrží**

	<u>DN</u>	<u>Množst.</u>	<u>M.i.</u>	<u>Jednotk. cena</u>	<u>Celková cena</u>
<b>Nádrž H401A (vzdálenost od strojovny k nádrži je 155m)</b>					
potrubí	80	155 m		845,00	130 975 Kč
potrubí	65	155 m		800,00	124 000 Kč
potrubí	125	155 m		1 000,00	155 000 Kč
potrubí	40	20 m		570,00	11 400 Kč
kohout	40	9 ks		630,00	5 670 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč
<b>Nádrž H401D (vzdálenost od strojovny k nádrži je 140m)</b>					
potrubí	80	140 m		845,00	118 300 Kč
potrubí	65	140 m		800,00	112 000 Kč
potrubí	125	140 m		1 000,00	140 000 Kč
potrubí	40	20 m		570,00	11 400 Kč
kohout	40	9 ks		630,00	5 670 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč
<b>Nádrž H401B (vzdálenost od strojovny k nádrži je 35m)</b>					
potrubí	80	35 m		845,00	29 575 Kč
potrubí	65	35 m		800,00	28 000 Kč
potrubí	125	35 m		1 000,00	35 000 Kč
potrubí	40	10 m		570,00	5 700 Kč
kohout	40	6 ks		630,00	3 780 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč
<b>Nádrž H401C (vzdálenost od strojovny k nádrži je 45m)</b>					
potrubí	80	45 m		845,00	38 025 Kč
potrubí	65	45 m		800,00	36 000 Kč
potrubí	125	45 m		1 000,00	45 000 Kč
potrubí	40	10 m		570,00	5 700 Kč
kohout	40	6 ks		630,00	3 780 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč
<b>Nádrž H211B (vzdálenost od strojovny k nádrži je 90m)</b>					
potrubí	65	75 m		800,00	60 000 Kč
potrubí	50	105 m		750,00	78 750 Kč
potrubí	100	90 m		980,00	88 200 Kč
potrubí	40	20 m		570,00	11 400 Kč
kohout	40	9 ks		630,00	5 670 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč
<b>Nádrž H211A (vzdálenost od strojovny k nádrži je 120m)</b>					
potrubí	65	80 m		800,00	64 000 Kč
potrubí	50	160 m		750,00	120 000 Kč
potrubí	100	120 m		980,00	117 600 Kč
potrubí	40	20 m		570,00	11 400 Kč
kohout	40	9 ks		630,00	5 670 Kč
potrubí	50	5 m		750,00	3 750 Kč
kohout	50	3 ks		830,00	2 490 Kč
drobné armatury		1 kpl		23 000,00	23 000 Kč

**1 783 105 Kč****2. Výměna potrubí od paty nádrže směrem nahoru + prstence na nádrži + střecha**

<u>DN</u>	<u>Množst.</u>	<u>M.i.</u>	<u>Celková cena</u>
-----------	----------------	-------------	---------------------

**Nádrž H211B**

Stoupačky (výška 10m)				
potrubí	50	10 m	750,00	7 500 Kč
potrubí	50	10 m	750,00	7 500 Kč
potrubí	100	10 m	980,00	9 800 Kč
Prstence (3x obvod 80m) + střecha (délka 30m)				
potrubí	50	80 m	900,00	72 000 Kč
potrubí	80	80 m	1 000,00	80 000 Kč
potrubí	50	80 m	900,00	72 000 Kč
potrubí	50	30 m	900,00	27 000 Kč
Ostatní				
kohout		6 ks	900,00	5 400 Kč
filtr	50	6 ks	1 900,00	11 400 Kč
filtr	80	2 ks	2 800,00	5 600 Kč
tryska		100 ks	750,00	75 000 Kč
drobné armatury		1 kpl	23 000,00	23 000 Kč

**Nádrž H211A**

Stoupačky (výška 10m)				
potrubí	50	10 m	750,00	7 500 Kč
potrubí	50	10 m	750,00	7 500 Kč
potrubí	100	10 m	980,00	9 800 Kč
Prstence (3x obvod 80m) + střecha (délka 30m)				
potrubí	50	80 m	900,00	72 000 Kč
potrubí	80	80 m	1 000,00	80 000 Kč
potrubí	50	80 m	900,00	72 000 Kč
potrubí	50	30 m	900,00	27 000 Kč
Ostatní				
kohout		6 ks	900,00	5 400 Kč
filtr	50	6 ks	1 900,00	11 400 Kč
filtr	80	2 ks	2 800,00	5 600 Kč
tryska		100 ks	750,00	75 000 Kč
drobné armatury		1 kpl	23 000,00	23 000 Kč

**792 400 Kč****3. Výměna potrubí vodní clony budovy SHZ 411**

	<u>DN</u>	<u>Množst.</u>	<u>M.i.</u>	<u>Celková cena</u>
potrubí	50	25 m	750,00	18 750 Kč
tryska		9 ks	750,00	6 750 Kč
drobné armatury		1 kpl	11 000,00	11 000 Kč

**Mezisoučet 36 500 Kč****4. Ostatní činnosti**

	<u>komplet</u>	<u>Jednotk. cena</u>	<u>Celková cena</u>
Proplachy	1	50 000,00	50 000 Kč
Tlakové zkoušky	1	97 995,00	97 995 Kč
Projektová dokumentace	1	30 000,00	30 000 Kč
VRN <i>vč. manipulační techniky (plošiny, lešení), dopravného, projektového řízení, ubytování, atp.</i>	1	200 000,00	200 000 Kč

**Mezisoučet 377 995 Kč****Celková cena za dílo (Kč bez DPH)****2 990 000 Kč**

0,00



## PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

### A/ Třemošná:


- nákup materiálu.....1 až 4 týden od podpisu smlouvy
- demontáže.....3 až 9 týden od podpisu smlouvy
- montáže.....4 až 11 týden od podpisu smlouvy
- zkoušky a doklady.....12 týden od podpisu smlouvy


### B/ Šlapanov:

- nákup materiálu.....1 až 4 týden od podpisu smlouvy
- demontáže.....3 až 6 týden od podpisu smlouvy
- montáže.....4 až 8 týden od podpisu smlouvy
- zkoušky a doklady.....9 týden od podpisu smlouvy

### C/ Třemošná:

- nákup materiálu.....1 až 4 týden od podpisu smlouvy
- demontáže.....3 až 8 týden od podpisu smlouvy
- montáže.....4 až 9 týden od podpisu smlouvy
- zkoušky a doklady.....10 týden od podpisu smlouvy

  
TRASER CZ S.R.O.  
Videňská 134/102, 619 00 Brno  
Tel.: 728247794, Fax: 547426596  
IČ: 29198186, DIČ: CZ29198186

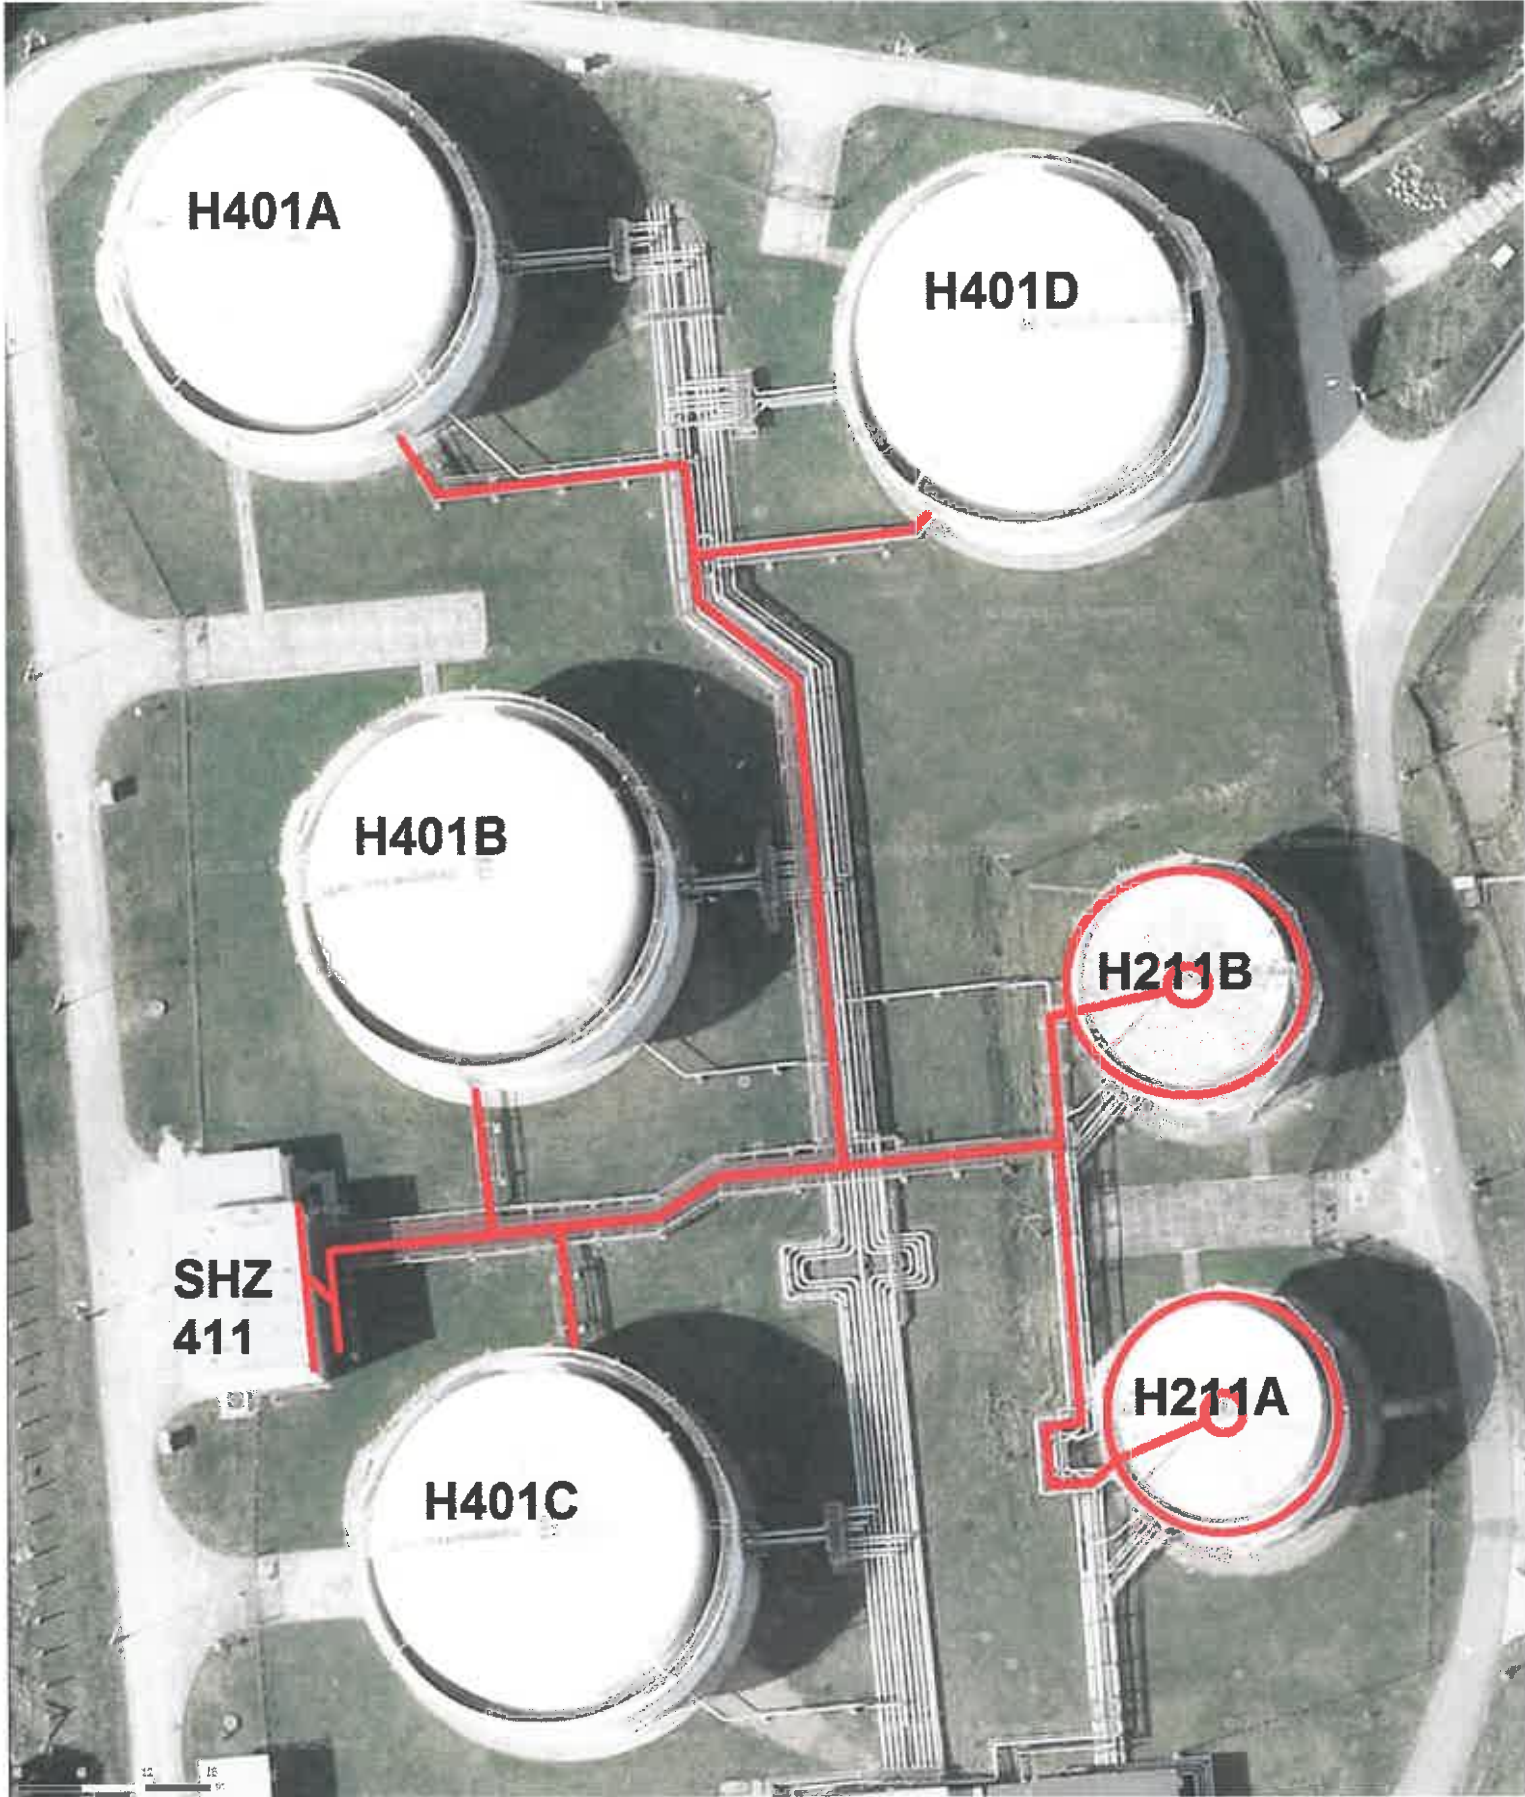

H401A

H401D

H401B

H211B

SHZ  
411

H401C

H211A



## **TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE (REALIZACE):**

- nákup materiálů a dílů nových zařízení.
- vypracování výrobní dokumentace.
- výroba potrubních dílů a jejich doprava na místo realizace.
- průběžná kontrola a doplňování materiálu v místě realizace.
- zajištění mont. mechanismů pro montáž ( kromě střediska Šlapánov).
- postupná demontáž stávajících zařízení (s respektováním všech bezpečnostních pokynů).
- následná postupná montáž nových zařízení (s respektováním všech bezpečnostních pokynů).
- zkoušky nových zařízení.
- doklady, předání a převzetí díla.
